Reunión de Kick-Off | Referentes DIARCO y Zeetrex

10 de Noviembre de 2026

Implementación Bloque 1: Alineación y Ejecución Operativa

De SGM a Connexa — El plan estratégico para una migración progresiva y sin disrupciones.



Gemini Notebook

La Filosofía de Migración: **Continuidad sobre Velocidad**

SGM está técnicamente obsoleto. La decisión estratégica es migrar, pero NUNCA a expensas de la operación de DIARCO.

Descartado: Corte Único ("Big Bang")

- **Enfoque**: Reemplazo total en una sola fecha.
- **Riesgo Operativo**: Crítico. Cualquier falla detiene la cadena de abastecimiento.
- **Autoridad de Datos**: Confusión inmediata de la verdad.

Elegido: Convivencia Progresiva

- **Enfoque**: Transición gradual por población, versión y circuito.
- **Riesgo Operativo**: Controlado y encapsulado.
- **Autoridad de Datos**: Un único origen de verdad claro por cada dominio funcional.

Gemini Notebook

Perímetro de Acción:
Bloque 1 vs. Bloque 2

Disponibilidad técnica ≠ Aceptación funcional ≠ Permiso de operar.

B1 (Convivencia y Gates) [FOCO ACTUAL]


- - **Catálogo**, maestros, surtido y listas/acuerdos de compra.
- - **Forecast/compra** y **Órdenes de Compra** (OC) integradas con SGM.
- - **Recepción e inventarios/ajustes** (Stock oficial inicialmente SGM).
- - **PDD y transferencias** (Condicionado a Valkimia).

B2 (Hoja de Ruta) [FUTURO A CONFIRMAR]

- - Márgenes, precios de venta y publicación.
- - Control de gestión comercial, ofertas y promociones.
- - Kardex valorizado y autonomía total de stock.
- - Planificación avanzada (TMS) y datos para BI.

Gemini Notebook

Tres Estados:
Una Migración Controlada

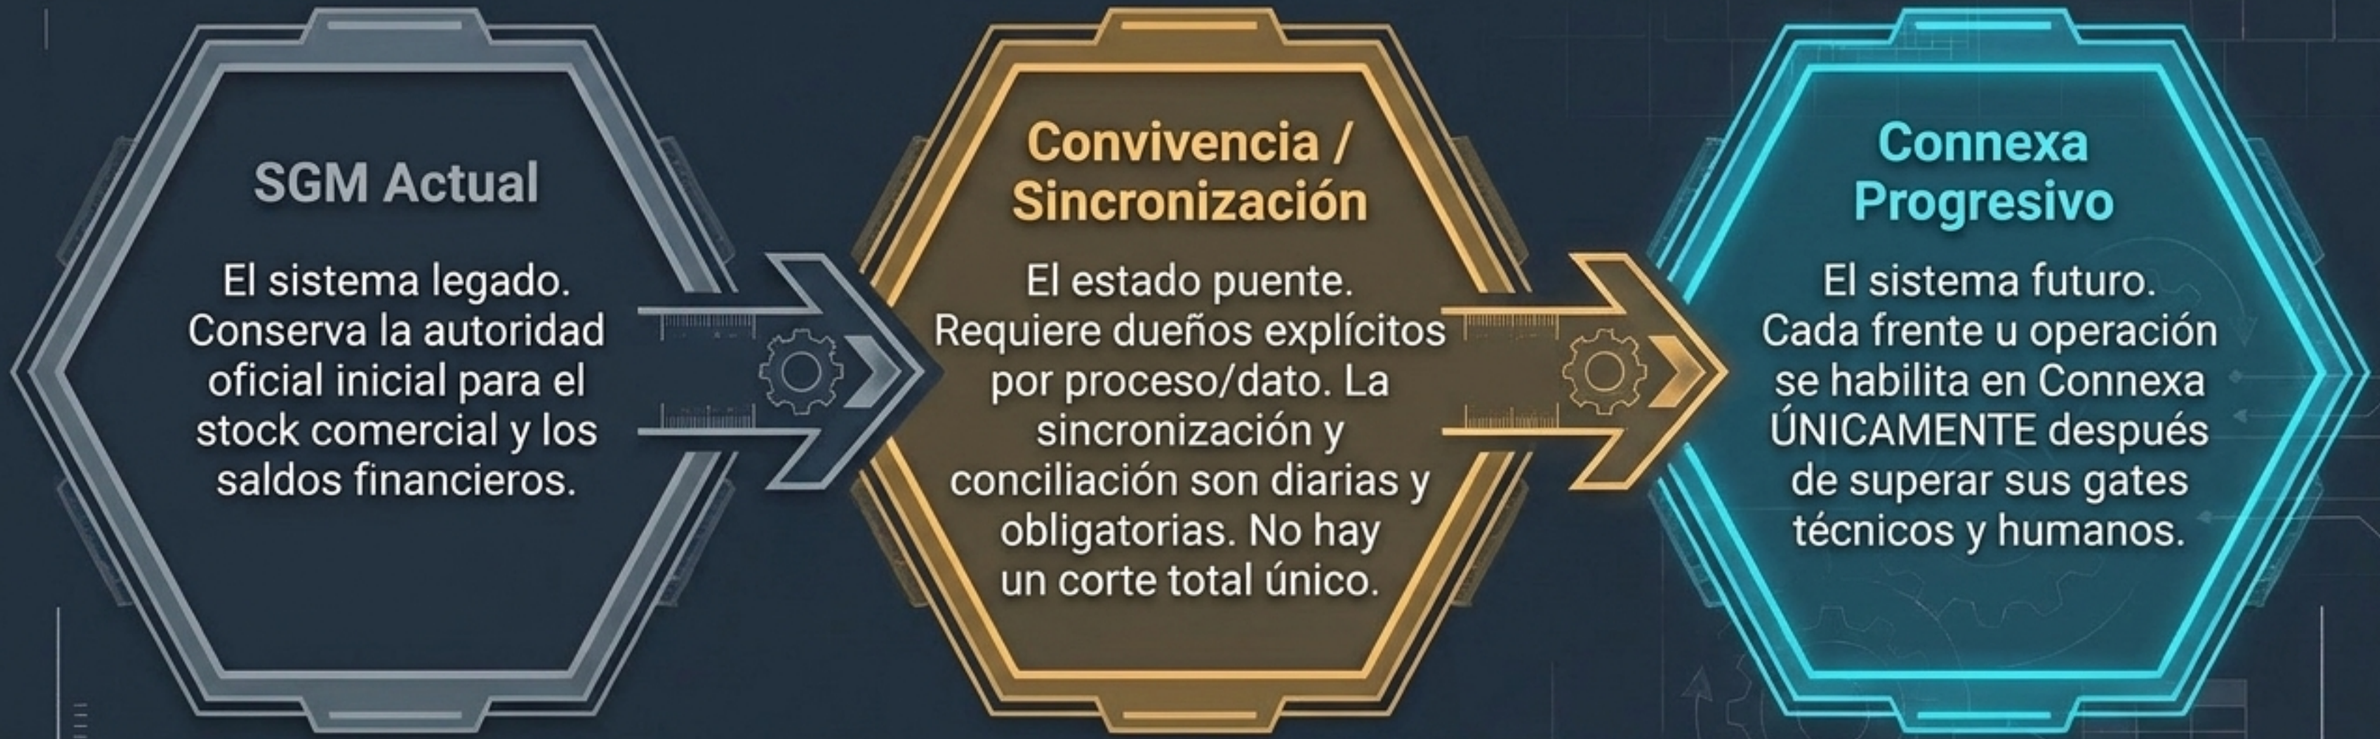


Gemini Notebook

El Motor de Convivencia: Autoridad del Dato

Un solo escritor por dominio. La carga inicial no equivale a una sincronización recurrente.
El dueño del dato **define la dirección de la flecha.**

The Coexistence Engine

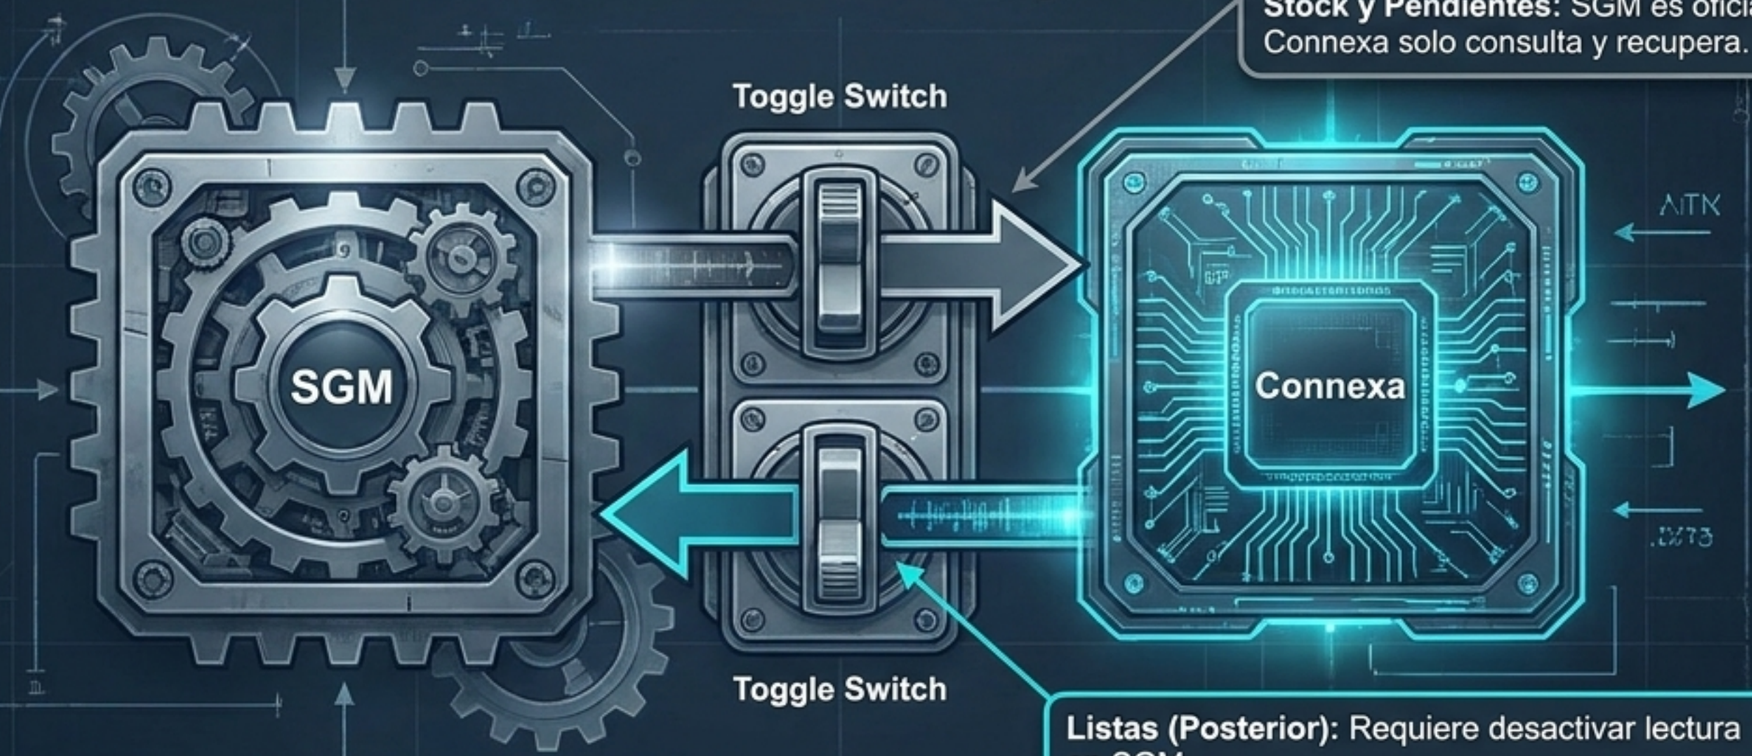

Listas (Inicial): SGM es el origen autorizado.
Stock y Pendientes: SGM es oficial; Connexa solo consulta y recupera.

Listas (Posterior): Requiere desactivar lectura en SGM.
OC, Recepción y Ajustes: Registro nace en Connexa, acusando recibo a SGM.

Gemini Notebook

El Ciclo de Vida: Decisiones G0–G4



G4 (Operación Transferida): 5 días operativos estables propuestos desde la habilitación efectiva. Autonomía total.

G3 (Oleada Autorizada): Población delimitada y acta operativa firmada.

G2 (Piloto Aceptado): Observación en paralelo. 2 ciclos completos, conciliación exitosa.

G1 (Preparación y UAT): Casos críticos superados; sin defectos bloqueantes. Un "smoke test" verde no reemplaza la UAT.

G0 (Inicio Comprometido): Alcance, roles nominales (titular/suplente), horas autorizadas. (No es solo cargar nombres en un Excel).

Gemini Notebook

Responsabilidades In-Delegables

Asistir a una inducción no equivale a estar capacitado ni preparado.

DIARCO

Referentes
Aportan datos reales. Practican. Ejecutan casos de UAT. Registran evidencia y defectos.

Dueño del Proceso
Definen resultado esperado/tolerancias. Aceptan funcionalmente la versión y alcance. (Zeetrex NO puede aceptar en su nombre).

Mesa L1 / IT
Entornos, permisos, interfaces/SGM, resguardo de cajas, registro y escalamiento.

Zeetrex

Zeetrex Funcional (Cambio)
Prepara casos, facilita, coordina la agenda y enseña (CMZ).

Zeetrex Técnico (L2)
Diagnostica interfaces, corrige defectos, acompaña repruebas.

Gemini Notebook


La Primera Misión: Piloto C07 (No Comestibles)

Habilitadores Transversales

C01 (Maestros): Dataset y maestría confirmada para el subconjunto.

C03 (Listas): Reglas y esperados aprobados por proveedor.

C15 (SGM): Certificación del camino, contrato OC y único emisor.

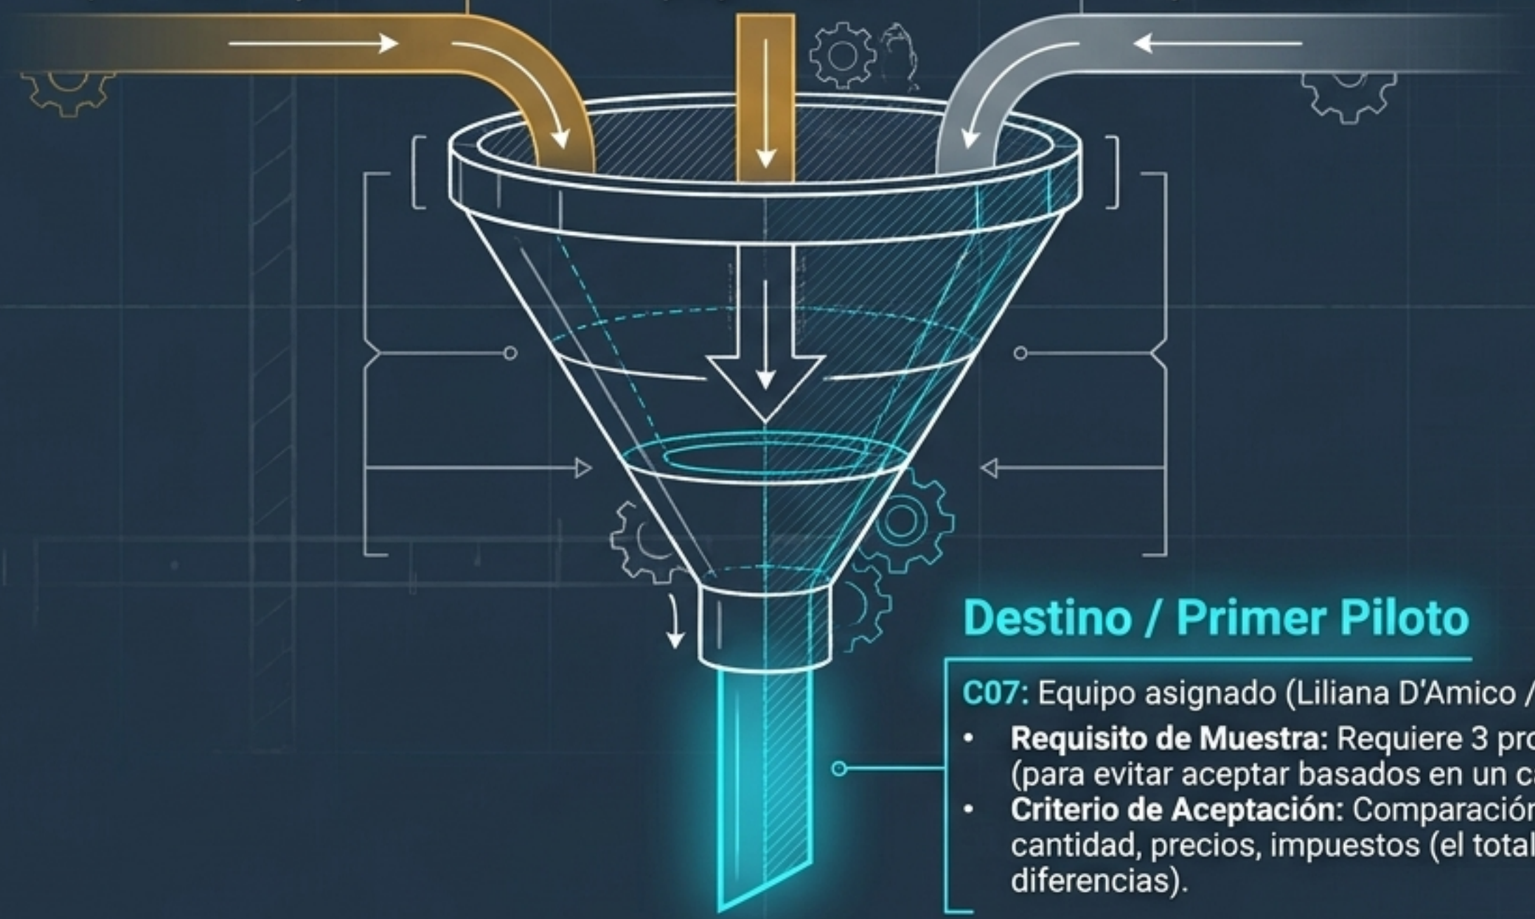

Destino / Primer Piloto


C07: Equipo asignado (Liliana D'Amico / Carolina Tavernisse).

- **Requisito de Muestra:** Requiere 3 proveedores distintos (para evitar aceptar basados en un caso simple).
- **Criterio de Aceptación:** Comparación por línea de cantidad, precios, impuestos (el total global no compensa diferencias).

Gemini Notebook

El Ciclo de Paralelo (G1 → G2): Operación Controlada

El paralelo NO es el ambiente TEST. Es operación real observada que alimenta el aprendizaje de los siguientes frentes.

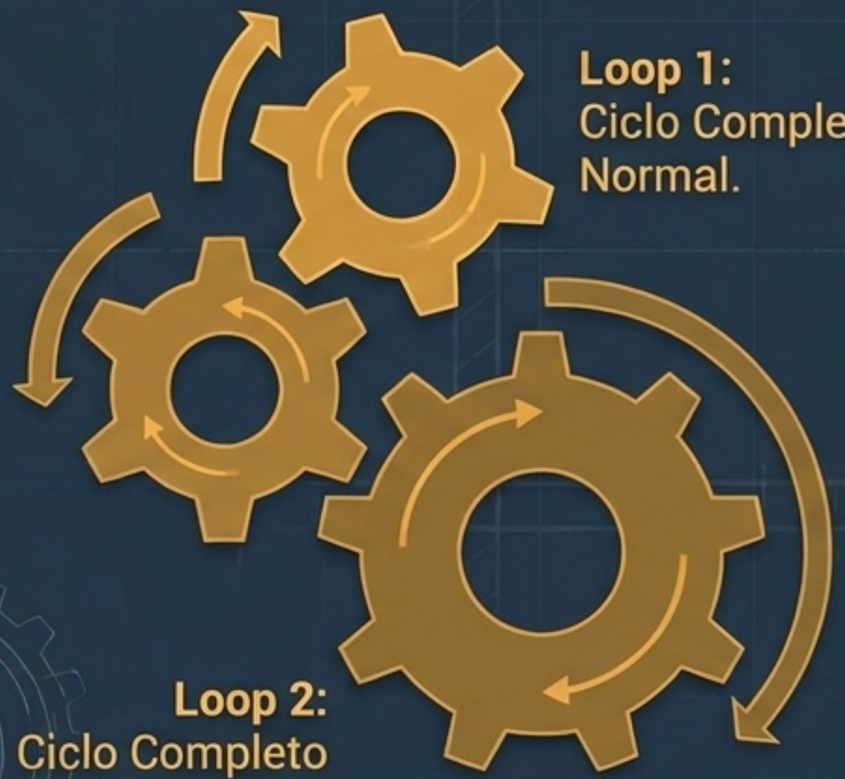

Loop 1:
Ciclo Completo Normal.

Loop 2:
Ciclo Completo con Excepción.

Conciliation Panel (Checklist de Habilitación G2)


- ❑ Único envío real al proveedor.
- ❑ Comparación de resultados diarios vs. SGM/DIARCO.
- ❑ Contingencia y soporte L1/L2 ensayados.

Advertencia: La frecuencia real de compra del proveedor define la duración. El G2 no es una fecha automática.

Gemini Notebook

Dependencias Físicas y Externas: Barreras Duras


C10/C11 Recepción

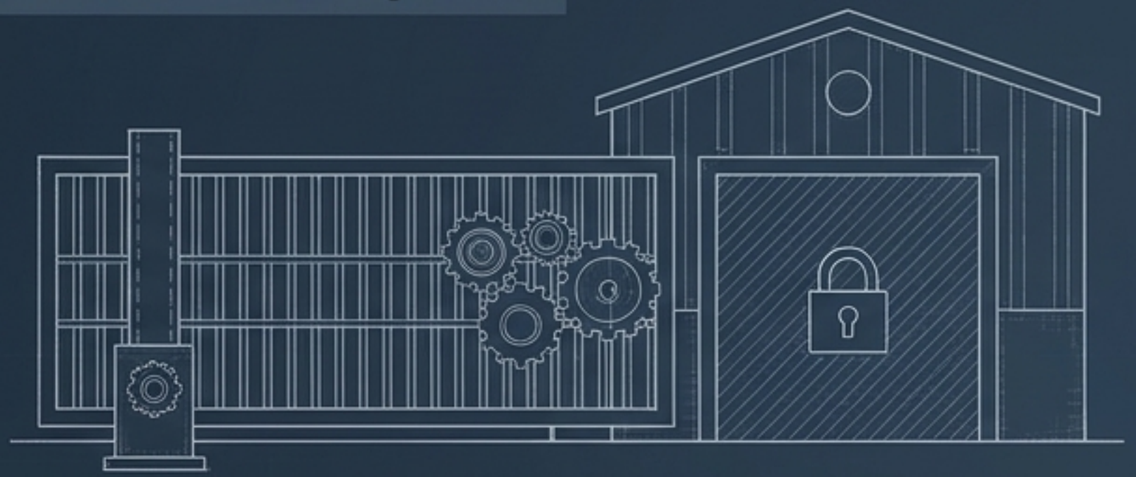

Tener el software disponible no equivale a tener la sucursal habilitada.

Cableado AP → Wi-Fi configurado/ probado → PDA disponible/ configurada → Práctica en sitio.

C14 Base 2 / Valkimia

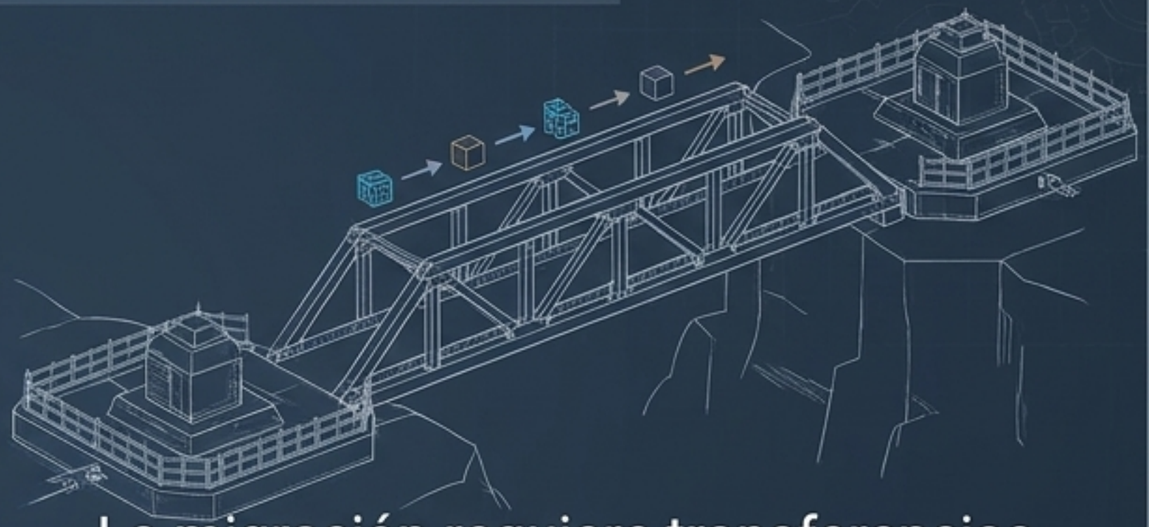

La migración requiere transferencias desde Base 2.

Contrato SGM-Valkimia → Ejecución en Valkimia → Retorno a SGM → Recuperación sin duplicar en Connexa.

(Actualmente sin UAT ni G2 aprobados).

Gemini Notebook

Ventanas Condicionales: Noviembre – Enero

Quincena Heatmap Matrix

Preparación (Blue) TEST/UAT (Turquoise) Paralelo/Observación (Warm Amber)

	Nov 1-15	Nov 16-30	Dic 1-15	Dic 16-31	Ene 1-15	Ene 16-31
C01/C03/C15 Transversal						
C07 No Comestibles			TEST	Paralelo		Observación
Resto de Compras (C04, C05, etc.)		Preparación		TEST	Paralelo	Observación

- **15 de Diciembre:** Resguardo de Cajas. Todo cambio productivo queda sujeto a validación estricta de IT/Operaciones. TEST puede continuar.
- **Regla de Lectura:** Las barras distribuyen trabajo; NO son promesas de habilitación. Si faltan personas o hay defectos, se replanifica.

Gemini Notebook

La Velocidad es Condicional: Anatomía del Compromiso

El cronograma es una ilusión sin capacidad dedicada.
Un nombre en el Excel no es un equipo aprobado.

Titular y Suplente Nominales
+ Horas Protegidas y Avaladas (Estimado: 6h Titular, 4h Suplente/semana)
+ Datos Reales y Esperados Definidos
+ Firma del Dueño con Facultad de Aceptar

= VELOCIDAD DE MIGRACIÓN B1


Los sistemas no migran sistemas. Las personas de DIARCO migran la operación.

Gemini Notebook

Decisiones Requeridas para Iniciar



Definición de C07: Confirmar la población exacta y los 3 proveedores distintos para el piloto No Comestibles.



Agenda Inmediata: Ratificar disponibilidad y sedes para las reuniones sectoriales C07 (12/11).



Confirmación de Capacidad: Aprobación explícita de jefatura para las horas de las dos células funcionales, la ventana IT/SGM y la Mesa L1.



Regla de Resguardo: IT y Operaciones deben ratificar la restricción del 15/12.



Dueños Nominales: Asignar responsables explícitos de aceptación funcional por cada frente (Food, Perecederos, Carnes, Non-Food, Barrio).

Lo pendiente queda con responsable y fecha acordada, no bajo una aprobación genérica.

Gemini Notebook
